



Ofício 035/2024-SEMOP

Rio Branco do Sul/PR, 30 de julho de 2024.

AO SENHOR

ALISSON DA SILVA RAMOS

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Assunto: Resposta – Requerimento nº 115/2024

Senhor Secretário,

Honrados em cumprimenta-lo, a Secretaria Municipal de Obras Públicas de Rio Branco do Sul/PR, através de seu Secretário Municipal ALANDERSON ESSENFELDER, de seu Diretor de Pavimentação CLEVERSON FERNANDO KVAS e de seu Diretor Administrativo ANDERSON ROBERTY SOPPA tecem neste ofício as explicações pertinentes externadas através do Requerimento nº 115/2024, o qual tem por requerentes os Excelentíssimos vereadores ANA FLÁVIA DE CASTRO e CLEVERSON DICÁ NALÍFICO, os quais tratam de obras e serviços de engenharia prestados pela empresa FJ CONSTRUTORA LTDA – EPP.

I) CONTRATO 170/2023

a. Cronograma de Execução das Obras

- i. O cronograma de execução, também implementado amplamente nos processos como cronograma físico-financeiro, encontra-se disponibilizado no Anexo I a este ofício, contemplando a etapa atual de execução e as previsões atualizadas.

b. Cronograma Financeiro

- i. Em relação ao cronograma financeiro, este podendo ser observado no anexo I a este ofício, em conjunto ao item i. e na planilha de medição, onde constam os dados de execução por serviço constam com seus percentuais de medição, valores já pagos e montante a ser pago, observando-se também o acompanhamento através das notas fiscais e comprovantes de





pagamento disponibilizados no anexo II.

c. Prazo para Execução das Obras

- i. Tratando-se do contrato nº 170/2023, a execução foi prevista inicialmente para o término em 21/07/2024, prazo este presente nos instrumentos contratuais. Conforme o andamento da obra, vislumbrou-se que o período de chuvas de outubro/23 ocasionou diversas interrupções no serviço, tendo em vista a necessidade de compactação das áreas em adequação, conforme demonstra-se no gráfico a seguir:

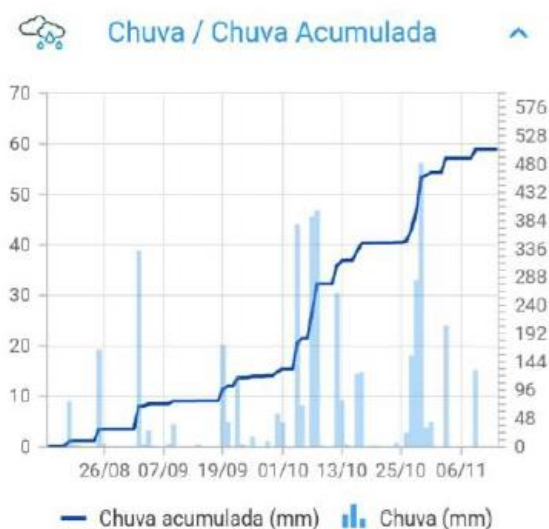


Gráfico de Chuvas – Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Vale do Ribeira – Dados Trimestrais de 2023 mostrando o aumento intenso de chuvas. Disponível via App IDR Clima IAPAR-EMATER.

Corroborar-se para tal fim a média histórica obtida onde o Paraná registrou o outubro mais chuvoso dos últimos 26 anos, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), quando a média estadual de precipitação foi de 360 milímetros, sendo que a média histórica é de 191 mm.



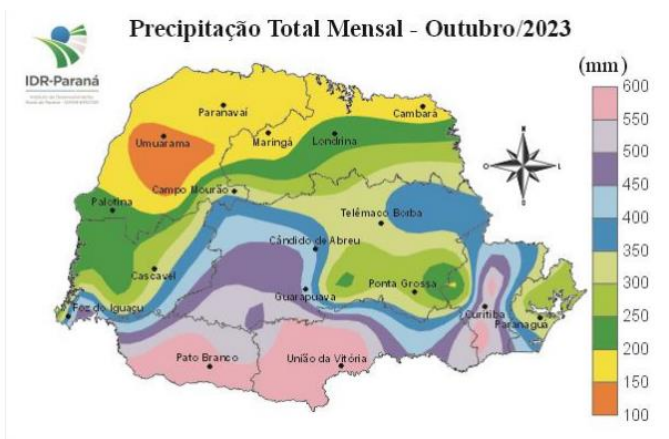


Figura 1. Precipitação (mm) registrada em outubro de 2023 no Paraná. Fonte: IDR-Paraná e Simepar.

Fonte: <https://www.idrparana.pr.gov.br/system/files/publico/agrometeorologia/boletimagrometeorologico/2023.34.pdf> em 12/06/2024

A erosão poderia afetar o sistema de drenagem e atingir a estrutura do pavimento e das calçadas (se houvesse penetração de água na base da rocha), considerando-se os efeitos destrutivos pelas pressões hidráulicas, ocasionando a mina completa da drenagem, do pavimento e das calçadas. Essas constantes infiltrações ameaçavam a integridade da infraestrutura física do conjunto.

Durante a execução dos serviços de revitalização do calçamento, foi iniciada a instalação da rede de esgoto do município, realizada pela SANEPAR, por meio do Contrato de Programa 010/2011, celebrado entre o Município de Rio Branco do Sul e a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), acompanhado pelos termos de atualização de contrato nº 001/22 e 002/22. A instalação dessas tubulações impactou diretamente no andamento da obra.

A instalação da rede de esgoto exigiu a abertura de diversos trechos ao longo da área onde estavam sendo realizados os trabalhos de revitalização do calçamento. Essas intervenções interferiram diretamente na programação, causando a





necessidade de interromper as atividades de pavimentação e calçamento em várias etapas.

Além disso, a presença constante de maquinários pesados da SANEPAR no local das obras gerou uma circulação intensa e frequente, prejudicando a continuidade e a segurança dos trabalhos. A movimentação dessas máquinas não apenas atrasou o cronograma, mas também danificou algumas áreas já trabalhadas, necessitando de reparos adicionais.



Obras de esgoto da SANEPAR nas vias de intervenção - <https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Sanepar-inicia-obra-de-esgoto-de-R-348-milhoes-em-Rio-Branco-do-Sul>

De efeito lógico, foi efetivado o termo aditivo nº 1, tendo por objeto a adição de prazo em 90 (noventa) dias de execução e vigência em 90 (noventa) dias visando a finalização da obra e levantamentos finais, em decorrência da elevação do período de chuvas e demais impactos durante a obra, devidamente aprovado dentro do Portal dos Municípios, sistema este do gerente da obra, Estado do Paraná (através da Secretaria das Cidades – SECID).

#### d. Reexecução de Obras

- i. Conforme mencionado no item 4 do requerimento, foram pontuados locais onde ocorreu a necessidade de nova execução dos serviços, com posterior aprovação da equipe técnica e





prosseguimento dos trâmites de pagamento. Neste tópico, é notório destacar a função dos fiscal e gestor do contrato, tal quais tecidas no contrato 170/2023, firmado entre esta municipalidade e a empresa executora, em seu parágrafo décimo:

*“Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.”(grifo nosso).*

Fica notório, diante do trecho apresentado e da legislação contida no instrumento convocatório e na Lei nº 14.133/21 que a CONTRATANTE fica ileso de valores derivados de reexecuções dos serviços, demonstrando a atuação proativa dos Gestor e Fiscal do contrato ora em questão, estando satisfeito o questionamento levantado.

Para o contrato supracitado e demais instrumentos gerenciados com operações de crédito ou repasses do Governo Estadual, sugerimos o acompanhamento através da plataforma PARANÁ INTERATIVO, sendo acessado diretamente no link: [https://sistemas.paranacidade.org.br/dados\\_site\\_paranacidade/index.php](https://sistemas.paranacidade.org.br/dados_site_paranacidade/index.php), sendo necessário informar o nome do Município na caixa de texto à direita da tela, tendo acesso às medições e aos relatórios fotográficos.

## II) CONTRATO 005/2024

### a. Cronograma de Execução das Obras

i. O cronograma físico-financeiro encontra-se disponibilizado no





Anexo III a este ofício.

**b. Cronograma Financeiro**

- i. O cronograma físico-financeiro encontra-se disponibilizado em conjunto no Anexo III a este ofício, apresentando-se com a nota fiscal e comprovante constantes no Anexo IV.

**c. Prazo para Execução de Obras**

- i. Os prazos relativos ao contrato em epígrafe foram satisfeitos, sendo executado dentro da vigência (sem necessidade de aditivos de prazo ou de valor) e a obra restando somente o processamento da medição final, com os respectivos termos de entrega.

**d. Reexecução de Obras**

- i. Assim como ocorre nos apontamentos pertinentes ao contrato 170/2023, o contrato em epígrafe não configurou, durante sua execução e entrega, necessidade de correções do serviço executado, estando plenamente alinhado ao projeto inicial contido no processo licitatório. Ainda, se tal item ocorresse, visto e notório a aplicação do dispositivo contido no item 10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, presentes no contrato:

*“10.1 São obrigações do Contratado:*

*[...]*

*10.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;”*





Assim explicitado neste documento, resta satisfeito o critério presente no requerimento em epígrafe.

Nos colocamos à disposição para quaisquer questionamentos que se fizerem necessários, reforçando nossos votos de estima e consideração, certos de sua compreensão.

CLEVERSON FERNANDO KVAS

Fiscal dos Contratos 170/2023 e 005/2024

ANDERSON ROBERTY SOPPA

Gestor dos Contratos 170/2023 e 005/2024

ALANDERSON ESSENFELDER

Secretário Municipal de Obras Públicas





# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AJUSTADO (TERMO ADITIVO N° 1)

Capital do Cimento

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DA RUA GEL CARLOS PIOLI

Rio Branco do Sul  
 Nº 28 | Lote Nº 1 | URBANIZAÇÃO /CALÇADAS | Convênio: 243/2023  
 Programa Transferências Voluntárias  
 FJ Construtora Ltda  
 17/0/2023  
 Nº Contrato 25/09/2023  
 Valor do Contrato 17/05/2025 (600 dias)  
 Data de Assinatura 21/07/2024 (300 dias)  
 Vigência 19/10/2024 (390 dias)  
 Novo Prazo de Execução 15/08/2025 (690 dias)

Município  
 Projeto  
 Programa  
 Empresa  
 Nº Contrato  
 Valor do Contrato  
 Data de Assinatura  
 Vigência  
 Novo Prazo de Execução  
 Nova Vigência

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO (MÊS)													
		1		2		3		4		5		6			
	TOTAL	PREVISTO	%	PREVISTO	%	PREVISTO	%	PREVISTO	%	PREVISTO	%	PREVISTO	%	PREVISTO	%
1	SERVICIOS PRELIMINARES	R\$ 209.521,24	25%	R\$ 52.380,31	25%	R\$ 104.760,62	75%	R\$ 52.380,31	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 52,02	100%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
3	BASE /SUB-BASE	R\$ 153.804,71	0%	R\$ 7.690,24	5%	R\$ 15.380,47	10%	R\$ 15.380,47	10%	R\$ 15.380,47	10%	R\$ 23.070,71	15%	R\$ 23.070,71	15%
4	REVESTIMENTO	R\$ 16.993,53	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.688,35	10%	R\$ 4.245,88	25%
5	MEIO-FIO E SARJETA	R\$ 485.658,16	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 48.565,82	10%	R\$ 48.565,82	10%	R\$ 72.848,72	15%	R\$ 72.848,72	15%
6	SERVICIOS DE URBANIZAÇÃO	R\$ 1.929.454,45	0%	R\$ 96.472,72	5%	R\$ 192.945,45	10%	R\$ 192.945,45	10%	R\$ 192.945,45	10%	R\$ 289.418,17	15%	R\$ 289.418,17	15%
7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	R\$ 185.982,21	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
10	DRENAGEM	R\$ 91.174,33	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 18.234,87	20%	R\$ 22.793,58	25%	R\$ 22.793,58	25%	R\$ 18.234,87	20%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>R\$ 52.432,33</b>	<b>2%</b>	<b>R\$ 209.923,58</b>	<b>7%</b>	<b>R\$ 281.355,91</b>	<b>8%</b>	<b>R\$ 327.506,91</b>	<b>11%</b>	<b>R\$ 279.695,31</b>	<b>9%</b>	<b>R\$ 409.829,63</b>	<b>13%</b>	<b>R\$ 407.818,35</b>	<b>13%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>R\$ 3.082.630,65</b>	<b>2%</b>	<b>R\$ 281.355,91</b>	<b>8%</b>	<b>R\$ 588.862,82</b>	<b>19%</b>	<b>R\$ 868.548,13</b>	<b>28%</b>	<b>R\$ 1.278.377,66</b>	<b>41%</b>	<b>R\$ 1.686.196,01</b>	<b>55%</b>	<b>R\$ 1.686.196,01</b>	<b>55%</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO (MÊS)											
		7ª MEDIÇÃO - EXECUTADO		8 - AJUSTADO		9 - AJUSTADO		10 - AJUSTADO					
	TOTAL	PREVISTO	%	PREVISTO	%	PREVISTO	%	PREVISTO	%	PREVISTO	%	PREVISTO	%
1	SERVICIOS PRELIMINARES	R\$ -	0%	R\$ 209.521,24	100%	R\$ 151.466,73	72%	R\$ 35.618,61	17%	R\$ 22.435,90	11%	R\$ -	0%
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 52,02	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 52,02	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
3	BASE /SUB-BASE	R\$ 153.804,71	15%	R\$ 107.863,29	70%	R\$ 117.694,04	77%	R\$ 12.304,38	8%	R\$ 15.380,47	10%	R\$ 8.425,62	5%
4	REVESTIMENTO	R\$ 16.993,53	15%	R\$ 10.190,11	60%	R\$ 13.731,89	81%	R\$ 1.698,35	10%	R\$ 1.553,29	9%	R\$ -	0%
5	MEIO-FIO E SARJETA	R\$ 485.658,16	15%	R\$ 315.677,81	65%	R\$ 348.694,55	72%	R\$ 48.565,82	10%	R\$ 39.831,98	8%	R\$ 48.565,82	10%
6	SERVICIOS DE URBANIZAÇÃO	R\$ 1.929.454,45	15%	R\$ 1.350.618,11	70%	R\$ 1.402.043,43	73%	R\$ 141.520,13	7%	R\$ 192.945,45	10%	R\$ 192.945,45	10%
7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	R\$ 185.982,21	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 97.991,11	50%	R\$ 97.991,11	50%
10	DRENAGEM	R\$ 91.174,33	10%	R\$ 91.174,33	100%	R\$ 62.861,00	69%	R\$ 18.234,87	20%	R\$ 10.078,46	11%	R\$ -	0%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>R\$ 388.700,91</b>	<b>12,93%</b>	<b>R\$ 2.084.896,92</b>	<b>67,63%</b>	<b>R\$ 2.096.491,64</b>	<b>68,01%</b>	<b>R\$ 257.994,17</b>	<b>9%</b>	<b>R\$ 380.216,65</b>	<b>12%</b>	<b>R\$ 347.928,19</b>	<b>11%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>R\$ 3.082.630,65</b>	<b>67,63%</b>	<b>R\$ 2.084.896,92</b>	<b>67,63%</b>	<b>R\$ 2.354.485,81</b>	<b>76%</b>	<b>R\$ 2.734.702,46</b>	<b>88%</b>	<b>R\$ 3.082.630,65</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 3.082.630,65</b>	<b>100%</b>

Rio Branco do Sul, 18 de junho de 2024

Cleveson Fernando Kvas  
 Fiscal de Contrato  
 CREA PR 141924/D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : RIO BRANCO DO SUL  
 PROJETO : REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS  
 CONVÊNIO Nº : 243/2023 PAM

MEDIÇÃO Nº: 7  
 DATA DA MEDIÇÃO : 03/06/2024

EMPRESA VENCEDORA : FJ CONSTRUTORA LTDA  
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 170/2023  
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 3.082.630,65  
 SAM Nº : 28  
 LOTE Nº : 1

DATA : 25/09/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 21/07/2024  
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/05/2025

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL  
 Nº DA LICITAÇÃO: 002/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$ ) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$ )MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	209.521,24	72,29%	209.521,24	151.466,73
2	2	TERRAPLENAGEM	100,00%	52,01		52,01	-
3	3	BASE / SUB-BASE	70,00%	107.663,29	76,52%	153.804,71	117.694,04
4	4	REVESTIMENTO	60,00%	10.190,11	80,85%	16.983,53	13.731,89
5	5	MEIO-FIO E SARJETA	65,00%	315.677,81	71,80%	485.658,17	348.694,55
6	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	70,00%	1.350.618,11	72,67%	1.929.454,45	1.402.043,43
7	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				195.982,21	-
8	10	DRENAGEM	100,00%	91.174,33	68,95%	91.174,33	62.861,00
TOTAL CRONOGRAMA				2.084.896,90		TOTAL MEDIÇÃO	2.096.491,64

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
151.131,43	335,30	0,16%
-	-	-
105.455,62	12.238,42	7,96%
	13.731,89	80,85%
344.592,02	4.102,53	0,84%
1.244.297,46	157.745,97	8,18%
-	-	-
43.282,82	19.578,18	21,47%
OK	Parcial	
Acumulado	Destá	
Med. Anterior	Medição	
1.888.759,35	207.732,29	

Importa a presente medição no valor total de R\$

**R\$207.732,29**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente  
 gov.br  
 FELIPE CESAR ROCHA  
 Data: 14/06/2024 12:59:16-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Cleverson  
 Fernando  
 Kvas  
 Assinado de forma digital por Cleverson Fernando Kvas  
 Dados: 2024.06.19 15:05:24 -03'00'

KARIME  
 FAYAD  
 07540359994  
 Assinado de forma digital por KARIME FAYAD 07540359994  
 Dados: 2024.06.19 15:21:21 -03'00'


FJ CONSTRUTORA LTDA  
 FELIPE CESAR ROCHA  
 ENG° CIVIL - CREA PR-89.661/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL  
 CLEVERSON FERNANDO KVAS  
 ENG° CIVIL - CREA PR-141.924/D

PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL  
 KARIME FAYAD

 <b>PREFEITURA DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	NOTA FISCAL <b>0000360</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 17/11/2023 15:29:29	
	DATA DO FATO GERADOR 17/11/2023	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>			
	ENDEREÇO RUA 613, Nº 162, TABULEIRO DOS OLIVEIRAS, ITAPEMA SC , 88220000					COMPLEMENTO
	Nº CPF/CNPJ <b>27.743.102/0001-53</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>14704</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 91608592</b>	E-MAIL <b>jeferson.radtke@bol.com.br</b>

### TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR <b>MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL</b>					
ENDEREÇO RUA HORACY SANTOS, Nº 222, CENTRO, CEP 83540000, RIO BRANCO DO SUL - PR					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>76.105.576/0001-85</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>4139738030</b>	E-MAIL <b>brunoriva.pgm.rbs@gmail.com</b>	

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	<b>REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS CONTRATO N 170/2023</b> <b>CUJO OBJETO E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA</b> <b>CARLOS PIOLI, COM AREA TOTAL DE 25.195M2/</b> <b>CONVENIO SFM - SISTEMA DE FINANCIAMENTO AOS MUNICIPIOS PAM</b> <b>PARANA CIDADES</b> <b>EMPENHO N 5631/2023</b> <b>DADOS PARA DEPOSITO</b> <b>BANCO 085 - AILOS CREDCREA</b> <b>AGENCIA 0106-6. CONTA CORRENTE 16.749-5</b> <b>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 70%. MAO DE OBRA 30%</b> <b>RETER INSS NA CNO N 90.017.04376/70</b>	102.682,53	102.682,53

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL <b>102.682,53</b>
-------------	----------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO <b>96.521,58</b>
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>SIM</b>	<b>3.388,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5,0000 %</b>	<b>30.804,77</b>	<b>1.540,24</b>	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO <b>LC116: 0702 - CNAE: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS</b>
--

### DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 71.877,76</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	---	------------------------------------

## OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Tributado Fora do Município</b>	RECOLHIMENTO <b>ISS A RECOLHER PELO TOMADOR</b>	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>RIO BRANCO DO SUL - PR</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 13.810,80 (13.45%)</b>
--	--	--	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8a7f50b5f1e403a5703948ba8d97461f**  
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f955365d2b8c237de10cfb6070c3d602

Recebi(emos) de **FJ CONSTRUTORA LTDA EPP** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000360**.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

**0000360**



## ATESTADO/AUTORIZAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que foram recebidos os Bens e/ou Serviços do presente documento, referente à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional.

EM RIO BRANCO DO SUL. 17 DE NOVEMBRO DE 2023.



Documento assinado digitalmente

CLEVERSON FERNANDO KVAS  
Data: 17/11/2023 16:53:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: CLEVERSON FERNANDO KVAS - ENGº CIVIL - CREA PR-141.924/D

CARGO: FISCAL DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Karime  
Fayad

Assinado de forma  
digital por Karime Fayad  
Dados: 2023.11.17  
16:54:38 -03'00'

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: KARIME FAYAD

PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE



Os Bens e/ou Serviços do presente documento, referentes à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional, estão de acordo com a medição realizada pela Prefeitura Municipal e Supervisionada pelo Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.

EM RIO BRANCO DO SUL, 17 DE NOVEMBRO DE 2023.


ASS: \_\_\_\_\_

NOME: RUBENS GUERRA - CREA PR-160.663/D

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

 <b>PREFEITURA DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	NOTA FISCAL <b>0000382</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 15/01/2024 09:49:16	
	DATA DO FATO GERADOR 15/01/2024	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>	NOME FANTASIA PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>				
	ENDEREÇO RUA 613, Nº 162, TABULEIRO DOS OLIVEIRAS, ITAPEMA SC , 88220000					COMPLEMENTO
	Nº CPF/CNPJ <b>27.743.102/0001-53</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>14704</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 91608592</b>	E-MAIL <b>jeferson.radtke@bol.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL</b>					
ENDEREÇO RUA HORACY SANTOS, Nº 222, CENTRO, CEP 83540000, RIO BRANCO DO SUL - PR					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>76.105.576/0001-85</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>4139738030</b>	E-MAIL <b>brunoriva.pgm.rbs@gmail.com</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	<b>REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS CONTRATO N 170/2023</b> <b>CUJO OBJETO E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA</b> <b>CARLOS PIOLI, COM AREA TOTAL DE 25.195M2/</b> <b>CONVENIO SFM - SISTEMA DE FINANCIAMENTO AOS MUNICIPIOS</b> <b>PAM</b> <b>PARANA CIDADES</b> <b>EMPENHO N 5631/2023</b> <b>DADOS PARA DEPOSITO</b> <b>BANCO 085 - AILOS CREDCREA</b> <b>AGENCIA 0106-6. CONTA CORRENTE 16.749-5</b> <b>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 70%. MAO DE OBRA 30%</b> <b>RETER INSS NA CNO N 90.017.04376/70</b>	107.170,04	107.170,04

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL <b>107.170,04</b>
-------------	----------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO <b>100.739,84</b>
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>SIM</b>	<b>3.536,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5,0000 %</b>	<b>32.151,02</b>	<b>1.607,55</b>	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO <b>LC116: 0702 - CNAE: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS</b>
--

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 75.019,02</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	---	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Tributado Fora do Município</b>	RECOLHIMENTO <b>ISS A RECOLHER PELO TOMADOR</b>	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>RIO BRANCO DO SUL - PR</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 14.414,37 (13.45%)</b>
--	--	--	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8001b59f3448120847cb78dfdaa06cd2**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f955365d2b8c237de10cfb6070c3d602

Recebi(emos) de **FJ CONSTRUTORA LTDA EPP** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000382**.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

**0000382**

BAUHAUS SISTEMAS ®



## ATESTADO/AUTORIZAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que foram recebidos os Bens e/ou Serviços do presente documento, referente à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional.

EM RIO BRANCO DO SUL, 15 DE JANEIRO DE 2024.



Documento assinado digitalmente  
CLEVERSON FERNANDO KVAS  
Data: 23/01/2024 16:03:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: CLEVERSON FERNANDO KVAS - ENGº CIVIL - CREA PR-141.924/D  
CARGO: FISCAL DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

KARIME FAYAD

Assinado de forma digital por  
KARIME FAYAD 07540359994  
Dados: 2024.01.23 15:55:28  
-03'00'

ASS.: \_\_\_\_\_

07540359994

NOME: KARIME FAYAD

PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

Os Bens e/ou Serviços do presente documento, referentes à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional, estão de acordo com a medição realizada pela Prefeitura Municipal e Supervisionada pelo Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.


EM RIO BRANCO DO SUL, 15 DE JANEIRO DE 2024.

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: RUBENS GUERRA - CREA PR-160.663/D  
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

 <b>PREFEITURA DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	NOTA FISCAL <b>0000391</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 19/02/2024 11:39:29	
	DATA DO FATO GERADOR 19/02/2024	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>	NOME FANTASIA PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>				
	ENDEREÇO RUA 613, Nº 162, TABULEIRO DOS OLIVEIRAS, ITAPEMA SC , 88220000	COMPLEMENTO				
	Nº CPF/CNPJ <b>27.743.102/0001-53</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>14704</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 91608592</b>	E-MAIL <b>jeferson.radtke@bol.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL</b>					
ENDEREÇO RUA HORACY SANTOS, Nº 222, CENTRO, CEP 83540000, RIO BRANCO DO SUL - PR					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>76.105.576/0001-85</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>4139738030</b>	E-MAIL <b>brunoriva.pgm.rbs@gmail.com</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	<b>REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS CONTRATO N 170/2023</b> <b>CUJO OBJETO E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA</b> <b>CARLOS PIOLI, COM AREA TOTAL DE 25.195M2/</b> <b>CONVENIO SFM - SISTEMA DE FINANCIAMENTO AOS MUNICIPIOS</b> <b>PAM</b> <b>PARANA CIDADES</b> <b>EMPENHO N 5631/2023</b> <b>DADOS PARA DEPOSITO</b> <b>BANCO 085 - AILOS CREDCREA</b> <b>AGENCIA 0106-6. CONTA CORRENTE 16.749-5</b> <b>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 70%. MAO DE OBRA 30%</b> <b>RETER INSS NA CNO N 90.017.04376/70</b>	297.897,95	297.897,95

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL <b>297.897,95</b>
-------------	----------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO <b>280.024,07</b>
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>SIM</b>	<b>9.830,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5,0000 %</b>	<b>89.369,39</b>	<b>4.468,47</b>	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
LC116: 0702 - CNAE: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 208.528,56</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Tributado Fora do Município</b>	RECOLHIMENTO <b>ISS A RECOLHER PELO TOMADOR</b>	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>RIO BRANCO DO SUL - PR</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 40.067,27 (13.45%)</b>
--	--	--	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 17438fe5c14117a4fe779dfc34534618**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f955365d2b8c237de10cfb6070c3d602

Recebi(emos) de **FJ CONSTRUTORA LTDA EPP** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000391**.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

**0000391**

BAUHAUS SISTEMAS ®



## ATESTADO/AUTORIZAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que foram recebidos os Bens e/ou Serviços do presente documento, referente à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional.

EM RIO BRANCO DO SUL, 19 DE FEVEREIRO DE 2024



Documento assinado digitalmente

CLEVERSON FERNANDO KVAS  
Data: 21/02/2024 13:26:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: CLEVERSON FERNANDO KVAS - ENGº CIVIL - CREA PR-141.924/D

CARGO: FISCAL DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

KARIME FAYAD

Assinado de forma digital  
por KARIME FAYAD  
07540359994  
Dados: 2024.02.23 11:46:06  
-03'00'

07540359994

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: KARIME FAYAD

PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE



Os Bens e/ou Serviços do presente documento, referentes à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional, estão de acordo com a medição realizada pela Prefeitura Municipal e Supervisionada pelo Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.

EM RIO BRANCO DO SUL, 19 DE FEVEREIRO DE 2024


ASS: \_\_\_\_\_

NOME: RUBENS GUERRA - CREA PR-160.663/D

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

 <b>PREFEITURA DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	NOTA FISCAL <b>0000399</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 12/03/2024 19:45:23	
	DATA DO FATO GERADOR 12/03/2024	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>	NOME FANTASIA PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>				
	ENDEREÇO RUA 613, Nº 162, TABULEIRO DOS OLIVEIRAS, ITAPEMA SC , 88220000					COMPLEMENTO
	Nº CPF/CNPJ <b>27.743.102/0001-53</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>14704</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 91608592</b>	E-MAIL <b>jeferson.radtke@bol.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL</b>					
ENDEREÇO RUA HORACY SANTOS, Nº 222, CENTRO, CEP 83540000, RIO BRANCO DO SUL - PR					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>76.105.576/0001-85</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>4139738030</b>	E-MAIL <b>brunoriva.pgm.rbs@gmail.com</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	<b>REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS CONTRATO N 170/2023</b> <b>CUJO OBJETO E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA</b> <b>CARLOS PIOLI, COM AREA TOTAL DE 25.195M2/</b> <b>CONVENIO SFM - SISTEMA DE FINANCIAMENTO AOS MUNICIPIOS</b> <b>PAM</b> <b>PARANA CIDADES</b> <b>EMPENHO N 5631/2023</b> <b>DADOS PARA DEPOSITO</b> <b>BANCO 085 - AILOS CREDCREA</b> <b>AGENCIA 0106-6. CONTA CORRENTE 16.749-5</b> <b>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 60%. MAO DE OBRA 40%</b> <b>RETER INSS NA CNO N 90.017.04376/70</b>	451.433,15	451.433,15

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL <b>451.433,15</b>
-------------	----------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO <b>422.090,00</b>
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>SIM</b>	14.897,29	0,00	0,00	5.417,20	0,00	5,0000 %	180.573,26	9.028,66	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO LC116: 0702 - CNAE: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
---

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 270.859,89</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Tributado Fora do Município</b>	RECOLHIMENTO <b>ISS A RECOLHER PELO TOMADOR</b>	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>RIO BRANCO DO SUL - PR</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 60.717,76 (13.45%)</b>
--	--	--	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9b59cb3777fc4c48b378025aa4760d1f**  
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f955365d2b8c237de10cfb6070c3d602

Recebi(emos) de **FJ CONSTRUTORA LTDA EPP** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000399**.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

**0000399**

BAUHAUS SISTEMAS ®



## ATESTADO/AUTORIZAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que foram recebidos os Bens e/ou Serviços do presente documento, referente à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional.

EM RIO BRANCO DO SUL, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2024.



Documento assinado digitalmente  
CLEVERSON FERNANDO KVAS  
Data: 15/03/2024 14:53:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: CLEVERSON FERNANDO KVAS - ENGº CIVIL - CREA PR-141.924/D

CARGO: FISCAL DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

KARIME

FAYAD

ASS.: \_\_\_\_\_

07540359994

Assinado de forma digital por KARIME FAYAD 07540359994  
Dados: 2024.03.15 09:04:44 -03'00'

NOME: KARIME FAYAD

PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE



Os Bens e/ou Serviços do presente documento, referentes à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional, estão de acordo com a medição realizada pela Prefeitura Municipal e Supervisionada pelo Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.

EM RIO BRANCO DO SUL, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2024.


ASS: \_\_\_\_\_

NOME: RUBENS GUERRA - CREA PR-160.663/D

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

 <b>PREFEITURA DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	NOTA FISCAL <b>0000413</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 12/04/2024 17:21:04	
	DATA DO FATO GERADOR 12/04/2024	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>	NOME FANTASIA PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>				
	ENDEREÇO RUA 613, Nº 162, TABULEIRO DOS OLIVEIRAS, ITAPEMA SC , 88220000					COMPLEMENTO
	Nº CPF/CNPJ <b>27.743.102/0001-53</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>14704</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 91608592</b>	E-MAIL <b>jeferson.radtke@bol.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL</b>					
ENDEREÇO RUA HORACY SANTOS, Nº 222, CENTRO, CEP 83540000, RIO BRANCO DO SUL - PR					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>76.105.576/0001-85</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>4139738030</b>	E-MAIL <b>brunoriva.pgm.rbs@gmail.com</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	<b>REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS CONTRATO N 170/2023</b> <b>CUJO OBJETO E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA</b> <b>CARLOS PIOLI, COM AREA TOTAL DE 25.195M2/</b> <b>CONVENIO SFM - SISTEMA DE FINANCIAMENTO AOS MUNICIPIOS</b> <b>PAM</b> <b>PARANA CIDADES</b> <b>EMPENHO N 5631/2023</b> <b>DADOS PARA DEPOSITO</b> <b>BANCO 085 - AILOS CREDCREA</b> <b>AGENCIA 0106-6. CONTA CORRENTE 16.749-5</b> <b>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 60%. MAO DE OBRA 40%</b> <b>RETER INSS NA CNO N 90.017.04376/70</b>	<b>481.693,90</b>	<b>481.693,90</b>

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL <b>481.693,90</b>
-------------	----------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO <b>445.085,16</b>
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>SIM</b>	<b>21.194,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5,0000 %</b>	<b>192.677,56</b>	<b>9.633,88</b>	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO <b>LC116: 0702 - CNAE: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS</b>
--

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 289.016,34</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Tributado Fora do Município</b>	RECOLHIMENTO <b>ISS A RECOLHER PELO TOMADOR</b>	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>RIO BRANCO DO SUL - PR</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 64.787,83 (13.45%)</b>
--	--	--	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f365551a0284f8a96f692b4f20b3a6cd**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f955365d2b8c237de10cfb6070c3d602

Recebi(emos) de **FJ CONSTRUTORA LTDA EPP** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000413**.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

**0000413**

BAUHAUS SISTEMAS ®



## ATESTADO/AUTORIZAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que foram recebidos os Bens e/ou Serviços do presente documento, referente à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional.

EM RIO BRANCO DO SUL, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2024.



Documento assinado digitalmente

CLEVERSON FERNANDO KVAS  
Data: 15/04/2024 10:59:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: CLEVERSON FERNANDO KVAS - ENGº CIVIL - CREA PR-141.924/D

CARGO: FISCAL DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

KARIME FAYAD  
07540359994

Assinado de forma digital por  
KARIME FAYAD 07540359994  
Dados: 2024.04.15 11:06:15  
-03'00'

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: KARIME FAYAD

PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID  
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE



Os Bens e/ou Serviços do presente documento, referentes à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional, estão de acordo com a medição realizada pela Prefeitura Municipal e Supervisionada pelo Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.

EM RIO BRANCO DO SUL, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2024.


ASS: \_\_\_\_\_

NOME: RUBENS GUERRA - CREA PR-160.663/D

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

 <b>PREFEITURA DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	NOTA FISCAL <b>0000431</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 17/05/2024 12:51:15	
	DATA DO FATO GERADOR 17/05/2024	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>	NOME FANTASIA PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>				
	ENDEREÇO RUA 613, Nº 162, TABULEIRO DOS OLIVEIRAS, ITAPEMA SC , 88220000					COMPLEMENTO
	Nº CPF/CNPJ <b>27.743.102/0001-53</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>14704</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 91608592</b>	E-MAIL <b>jeferson.radtke@bol.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL</b>					
ENDEREÇO RUA HORACY SANTOS, Nº 222, CENTRO, CEP 83540000, RIO BRANCO DO SUL - PR					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>76.105.576/0001-85</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>4139738030</b>	E-MAIL <b>brunoriva.pgm.rbs@gmail.com</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	<b>REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS CONTRATO N 170/2023</b> <b>CUJO OBJETO E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA</b> <b>CARLOS PIOLI, COM AREA TOTAL DE 25.195M2/</b> <b>CONVENIO SFM - SISTEMA DE FINANCIAMENTO AOS MUNICIPIOS</b> <b>PAM</b> <b>PARANA CIDADES</b> <b>EMPENHO N 5631/2023</b> <b>DADOS PARA DEPOSITO</b> <b>BANCO 085 - AILOS CREDCREA</b> <b>AGENCIA 0106-6. CONTA CORRENTE 16.749-5</b> <b>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 60%. MAO DE OBRA 40%</b> <b>RETER INSS NA CNO N 90.017.04376/70</b>	447.881,78	447.881,78

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL <b>447.881,78</b>
-------------	----------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO <b>413.842,76</b>
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>SIM</b>	19.706,80	0,00	0,00	5.374,58	0,00	5,0000 %	179.152,72	8.957,64	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO <b>LC116: 0702 - CNAE: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS</b>
--

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 268.729,06</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Tributado Fora do Município</b>	RECOLHIMENTO <b>ISS A RECOLHER PELO TOMADOR</b>	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>RIO BRANCO DO SUL - PR</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 60.240,10 (13.45%)</b>
--	--	--	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 31d256c3b59ad056f847bf0e176517af**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f955365d2b8c237de10cfb6070c3d602

Recebi(emos) de **FJ CONSTRUTORA LTDA EPP** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000431**.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

**0000431**

BAUHAUS SISTEMAS ®



## ATESTADO/AUTORIZAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que foram recebidos os Bens e/ou Serviços do presente documento, referente à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional.

EM RIO BRANCO DO SUL, DE DE 2024.

Documento assinado digitalmente



CLEVERSON FERNANDO KVAS  
Data: 20/05/2024 09:30:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: CLEVERSON FERNANDO KVAS - ENGº CIVIL - CREA PR-141.924/D

CARGO: FISCAL DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

KARIME FAYAD

Assinado de forma digital por  
KARIME FAYAD 07540359994

ASS.: \_\_\_\_\_

07540359994

Dados: 2024.05.20 09:45:08  
-03'00'

NOME: KARIME FAYAD

PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE



Os Bens e/ou Serviços do presente documento, referentes à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional, estão de acordo com a medição realizada pela Prefeitura Municipal e Supervisionada pelo Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.

EM RIO BRANCO DO SUL, DE DE 2024.


ASS: \_\_\_\_\_

NOME: RUBENS GUERRA - CREA PR-160.663/D

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

 <b>PREFEITURA DE ITAPEMA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS	NOTA FISCAL <b>0000442</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 19/06/2024 14:03:49	
	DATA DO FATO GERADOR 19/06/2024	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>	NOME FANTASIA PRESTADOR <b>FJ CONSTRUTORA LTDA EPP</b>				
	ENDEREÇO RUA 613, Nº 162, TABULEIRO DOS OLIVEIRAS, ITAPEMA SC, 88220000					COMPLEMENTO
	Nº CPF/CNPJ <b>27.743.102/0001-53</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>14704</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>47 91608592</b>	E-MAIL <b>jeferson.radtke@bol.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL</b>					
ENDEREÇO RUA HORACY SANTOS, Nº 222, CENTRO, CEP 83540000, RIO BRANCO DO SUL - PR					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>76.105.576/0001-85</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>4139738030</b>	E-MAIL <b>brunoriva.pgm.rbs@gmail.com</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS CONTRATO N 170/2023 CUJU OBJETO E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA CARLOS PIOLI, COM AREA TOTAL DE 25.195M2/ CONVENIO SFM - SISTEMA DE FINANCIAMENTO AOS MUNICIPIOS PAM PARANA CIDADES EMPENHO N 5631/2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 085 - AILOS CREDCREA AGENCIA 0106-6. CONTA CORRENTE 16.749-5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 60%. MAO DE OBRA 40% RETER INSS NA CNO N 90.017.04376/70	207.732,29	207.732,29

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL <b>207.732,29</b>
-------------	----------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>SIM</b>	9.140,22	0,00	0,00	2.492,79	0,00	5,0000 %	83.092,91	4.154,65	<b>191.944,63</b>

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
LC116: 0702 - CNAE: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 124.639,38</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado Fora do Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RIO BRANCO DO SUL - PR	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 27.939,99 (13.45%)</b>
---	---	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ae927c9f16c69c444aa7febbd47b2b3e**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f955365d2b8c237de10cfb6070c3d602

Recebi(emos) de **FJ CONSTRUTORA LTDA EPP** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000442**.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

**0000442**

BAUHAUS SISTEMAS ®



## ATESTADO/AUTORIZAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que foram recebidos os Bens e/ou Serviços do presente documento, referente à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional.

EM RIO BRANCO DO SUL,

DE  
**Cleverson  
Fernando**

DE 2024.  
Assinado de forma  
digital por Cleverson  
Fernando Kvas

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: CLEVERSON FERNANDO KVAS - ENGº CIVIL - CREA PR-141.924/D  
CARGO: FISCAL DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

KARIME FAYAD  
07540359994

Assinado de forma digital  
por KARIME FAYAD  
07540359994  
Dados: 2024.06.19 15:21:02  
-03'00'

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: KARIME FAYAD

PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID  
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

Os Bens e/ou Serviços do presente documento, referentes à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 002/2023, Projeto REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DAS VIAS CENTRAIS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional, estão de acordo com a medição realizada pela Prefeitura Municipal e Supervisionada pelo Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.

EM RIO BRANCO DO SUL,

DE

DE 2024.

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: RUBENS GUERRA - CREA PR-160.663/D

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL



## Emissão de comprovantes

G3371215329431961  
12/12/2023 15:34:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.56  
2537202537 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 38.078-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO  
AGENCIA: 0106-6 - PA 01 - CENTRO  
CONTA: 16.749-5

FAVORECIDO: FJ CONSTRUTORA LTDA  
CPF/CNPJ: 27.743.102/0001-53  
VALOR: R\$ 95.412,61  
DEBITO EM: 12/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121201  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E9D.C71.478.CB7.B91

---

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:59  
253702537 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 38.078-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.537.000.013.400
VALOR TOTAL	2.341,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN RBS-CONSIGNACOES  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 13.400-7  
NR. DOCUMENTO 552.537.000.038.078  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.7F9.C86.EC9.FDE.B28
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE733135 CASSIA CORDEIRO WASSELIO.



## Emissão de comprovantes

G3312311198779301  
23/02/2024 11:27:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.47  
2537202537 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 38.078-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILLO  
AGENCIA: 0106-6 - PA 01 - CENTRO  
CONTA: 16.749-5

FAVORECIDO: FJ CONSTRUTORA LTDA  
CPF/CNPJ: 27.743.102/0001-53  
VALOR: R\$ 99.582,40  
DEBITO EM: 23/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.406.E22.B9E.297.3B6

---

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:54:39  
253702537 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 38.078-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.537.000.013.400
VALOR TOTAL	2.443,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN RBS-CONSIGNACOES  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 13.400-7  
NR. DOCUMENTO 552.537.000.038.078  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.9BD.20E.DA5.02A.73D
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE733135 CASSIA CORDEIRO WASSELIO.



## Emissão de comprovantes

G3310209485413431  
02/04/2024 09:50:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.43  
2537202537 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 38.078-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILLO  
AGENCIA: 0106-6 - PA 01 - CENTRO  
CONTA: 16.749-5

FAVORECIDO: FJ CONSTRUTORA LTDA  
CPF/CNPJ: 27.743.102/0001-53  
VALOR: R\$ 275.734,34  
DEBITO EM: 19/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2DD.5DD.B66.A14.33C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE768705 CASSIA CORDEIRO WASSELIO.



## Emissão de comprovantes

G3352415115355031  
24/04/2024 15:27:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.32  
2537202537 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 38.078-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILLO  
AGENCIA: 0106-6 - PA 01 - CENTRO  
CONTA: 16.749-5

FAVORECIDO: FJ CONSTRUTORA LTDA  
CPF/CNPJ: 27.743.102/0001-53  
VALOR: R\$ 415.589,36  
DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042301  
AUTENTICACAO SISBB: D.B4C.C63.3BC.7C4.AAC

---

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:27  
253702537 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 38.078-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.537.000.013.400
VALOR TOTAL	8.667,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN RBS-CONSIGNACOES  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 13.400-7  
NR. DOCUMENTO 552.537.000.038.078  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.E50.23D.F87.AE1.6A6
-----------------	-----------------------

---

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:27  
253702537 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO RIO BRANCO SUL

AGENCIA: 2537-2 CONTA: 38.078-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024

NR. DOCUMENTO 552.537.000.013.400

VALOR TOTAL 3.250,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN RBS-CONSIGNACOES

AGENCIA: 2537-2 CONTA: 13.400-7

NR. DOCUMENTO 552.537.000.038.078

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A25.2B2.679.FAC.958

---

Transação efetuada com sucesso por: JE733135 CASSIA CORDEIRO WASSELIO.



## Emissão de comprovantes

G3312008221657851  
20/05/2024 08:29:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.43  
2537202537 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 38.078-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILLO  
AGENCIA: 0106-6 - PA 01 - CENTRO  
CONTA: 16.749-5

FAVORECIDO: FJ CONSTRUTORA LTDA  
CPF/CNPJ: 27.743.102/0001-53  
VALOR: R\$ 438.148,77  
DEBITO EM: 17/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B62.93F.24B.74A.0E6

---

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:36  
253702537 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 38.078-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.537.000.013.400
VALOR TOTAL	9.248,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN RBS-CONSIGNACOES  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 13.400-7  
NR. DOCUMENTO 552.537.000.038.078  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.013.BD5.52C.BC2.F05
-----------------	-----------------------

---

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:36  
253702537 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO RIO BRANCO SUL

AGENCIA: 2537-2 CONTA: 38.078-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024

NR. DOCUMENTO 552.537.000.013.400

VALOR TOTAL 3.468,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN RBS-CONSIGNACOES

AGENCIA: 2537-2 CONTA: 13.400-7

NR. DOCUMENTO 552.537.000.038.078

=====

NR.AUTENTICACAO B.0A7.3BE.4B5.829.C25

---

Transação efetuada com sucesso por: JE733135 CASSIA CORDEIRO WASSELIO.



## Emissão de comprovantes

G3372114505590111  
21/06/2024 14:58:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.34  
2537202537 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
AGENCIA: 2537-2 CONTA: 38.078-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : MUNICIPIO RIO BRANCO SUL  
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILLO  
AGENCIA: 0106-6 - PA 01 - CENTRO  
CONTA: 16.749-5

FAVORECIDO: FJ CONSTRUTORA LTDA  
CPF/CNPJ: 27.743.102/0001-53  
VALOR: R\$ 419.217,34  
DEBITO EM: 19/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: C.C3A.B35.663.640.5A1

---

Transação efetuada com sucesso por: JE733135 CASSIA CORDEIRO WASSELIO.



**PLANILHA DE MEDIÇÃO - REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA BENJAMIN BONTORIM**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total				Medição 01	
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	% Executada	R\$ Executado
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>8.909,60</b>	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	8,00	315,97	344,40	33,04	2.629,28	3.006,72		
1.2	SEPAV05	Próprio	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO	m²	4.372,50	1,14	2.448,60	131,18	3.323,10	5.902,88	100%	3.006,72
											100%	5.902,88
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>361.204,57</b>	
<b>2.1</b>			<b>REPERFILAGEM</b>								<b>147.134,64</b>	
2.1.1	SEPAV06	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	m²	4.372,50	2,55	1.880,18	2.055,08	9.313,43	13.248,68	100%	13.248,68
2.1.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	87,45	1.223,38	3.568,83	6.200,21	117.489,08	127.258,11		
2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2.317,43	2,41	834,27	2.363,78	3.429,80	6.627,85	100%	127.258,11
											100%	6.627,85
<b>2.2</b>			<b>CAPA</b>								<b>214.069,93</b>	
2.2.1	SEPAV06	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	m²	4.372,50	2,55	1.880,18	2.055,08	9.313,43	13.248,68	100%	13.248,68
2.2.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	131,17	1.223,38	5.353,05	9.299,95	176.226,90	190.879,90		
2.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	3.476,00	2,41	1.251,36	3.545,52	5.144,48	9.941,36	100%	190.879,90
											100%	9.941,36
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>								<b>5.637,43</b>	
3.1	5214001	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	m²	245,03	13,70	126,02	579,64	3.285,88	3.991,54	100%	3.991,54
3.2	5213406	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	45,58	30,36	148,28	682,02	815,60	1.645,89	100%	1.645,89
<b>4</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>								<b>27.885,83</b>	
<b>4.1</b>			<b>PLACAS DE ADVERTÊNCIA</b>								<b>9.855,12</b>	
4.1.1	5213570	SICRO3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	2,84	479,94	168,90	215,23	1.237,17	1.621,30		-
4.1.2	5213864	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	14,00	494,44	235,27	668,63	7.329,92	8.233,82		-
<b>4.2</b>			<b>PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO</b>								<b>16.074,41</b>	
4.2.1	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	7,00	258,67	259,06	455,54	1.439,16	2.153,76		-
4.2.2	5213570	SICRO3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	2,75	479,94	163,55	208,41	1.197,96	1.569,92		-
4.2.3	5213864	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	21,00	494,44	352,90	1.002,94	10.994,89	12.350,73		-
<b>4.3</b>			<b>PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS</b>								<b>1.956,30</b>	
4.3.1	SEPAV01	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25 (2 PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	un	5,00	328,93	5,45	0,50	1.950,35	1.956,30		-
Importa a presente medição no valor total de R\$												
											<b>%</b>	<b>Total R\$</b>
											<b>93,09%</b>	<b>375.751,60</b>

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

"ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da XXXXX, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal."

FJ CONSTRUTORA LTDA  
FELIPE CESAR ROCHA  
ENGº CIVIL - CREA PR-89.551/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL  
CLEVERSON FERNANDO KVAS  
ENGº CIVIL - CREA PR-141.924/D

PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL  
KARIME FAYAD
